



Herinrichting Pastoorstraten Deurningen

Bijeenkomst 3 klankbordgroep

dinsdag 10 juni 2025



Agenda

- Update; waar staan we nu
- Ontwerp invulling per straat
 - Pastoor Teussestraat - inritconstructie
 - Pastoor Havinkstraat - snelheidsremmer
 - Hades – parkeren en trottoir aanbrengen
 - Pastoor Gloerichstraat - meer ruimte voor groen Variant 1
 - Pastoor Gloerichstraat - meer ruimte voor groen Variant 2
- Planning en vervolg
- Rondvraag

Waar staan we nu

Planning

Aanloop enquête	Onderzoek	Ontwerpfase	Contractfase	Vorbereidende werkzaamheden (nuts)	Werkvoorbereiding en Uitvoering
Tot - okt '24	Nov '24 – Apr '25	Apr '25 – Aug'25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26 – Q4 '26




Terugblik 2^e bijeenkomst

- Deelontwerpen uitgebreid naar VO, op basis van opmerkingen gemeente en klankbordgroep
- Vergroenen door het weghalen van trottoirs.
- Snelheidsremmer Pastoor Havinkstraat (rondom Hades) niet mogelijk.

Waar staan we nu


Ontwerpvoortgang

- Mrt '25: Klankbordgroep informatieavond
 - Input verkregen voor het voorlopig ontwerp en ontwerpvarianten afgestemd
- Jun '25: Presentatie volledig ontwerp Klankbordgroep
 - Doel is het vaststellen van het ontwerp en ophalen van mogelijke vragen inloopavond
- Jul '25: Inloopavond betrokkenen
 - Delen van het ontwerp en beschikbaar voor vragen uit de buurt



- gemeente **Dinkelland**

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

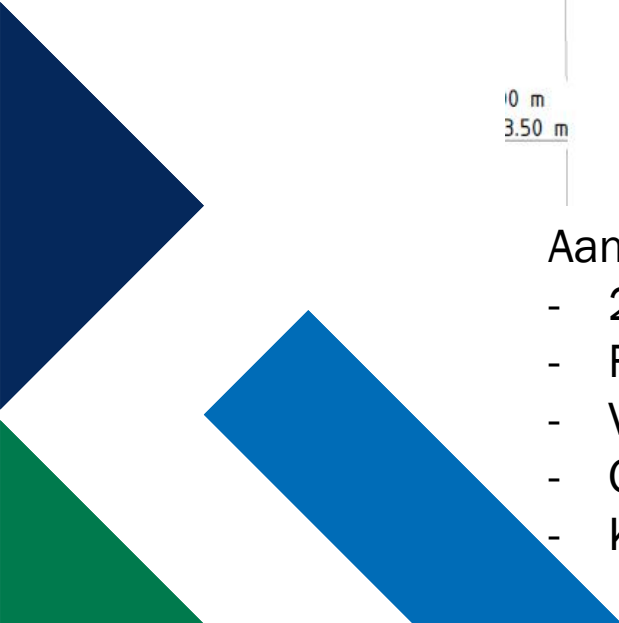

- 2 richtingen autoverkeer.
- Rijbaan 5,00 m breed met parkeerverbod westelijk incl. 5,00 m uit de bocht.)
- Voetpad tweezijdig behouden.
- Geen vergroening.
- Kruising Wilthuisstraat gelijkwaardig.

Technische opgave – Wilthuisstraat



Aandachtspunten:

- 2 richtingen autoverkeer.
- Rijbaan 6,00 m breed met parkeerverbod oostelijke zijde.
- Voetpad westzijde vergroenen.
- Verharding op brugdek behouden.


Technische opgave – Pastoor Havinkstraat West



Aandachtspunten:

- 2 richtingen autoverkeer.
- Rijbaan 6,00 m breed met parkeren op de rijbaan (3,50 m voor hulpdiensten beschikbaar)
- Versmallingen door groenvakken, LET OP! Hierdoor minder langsparkeren mogelijk.
- Vergroenen door voetpad zuidzijde te laten vervallen.
- Parkeren in het groen.


Technische opgave – Pastoor Havinkstraat Hofje

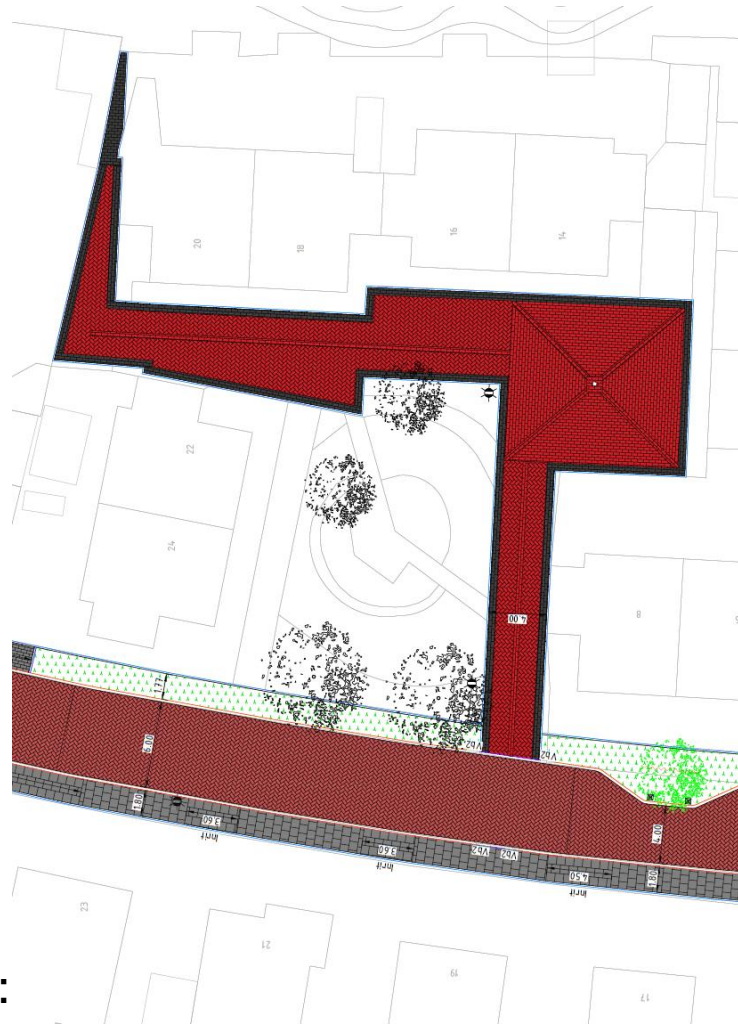

Aandachtspunten:

- Behoud van inrichting .
- Behoud van zo veel mogelijk bestaand bestratingsmateriaal.

Technische opgave – Pastoor Havinkstraat Oost

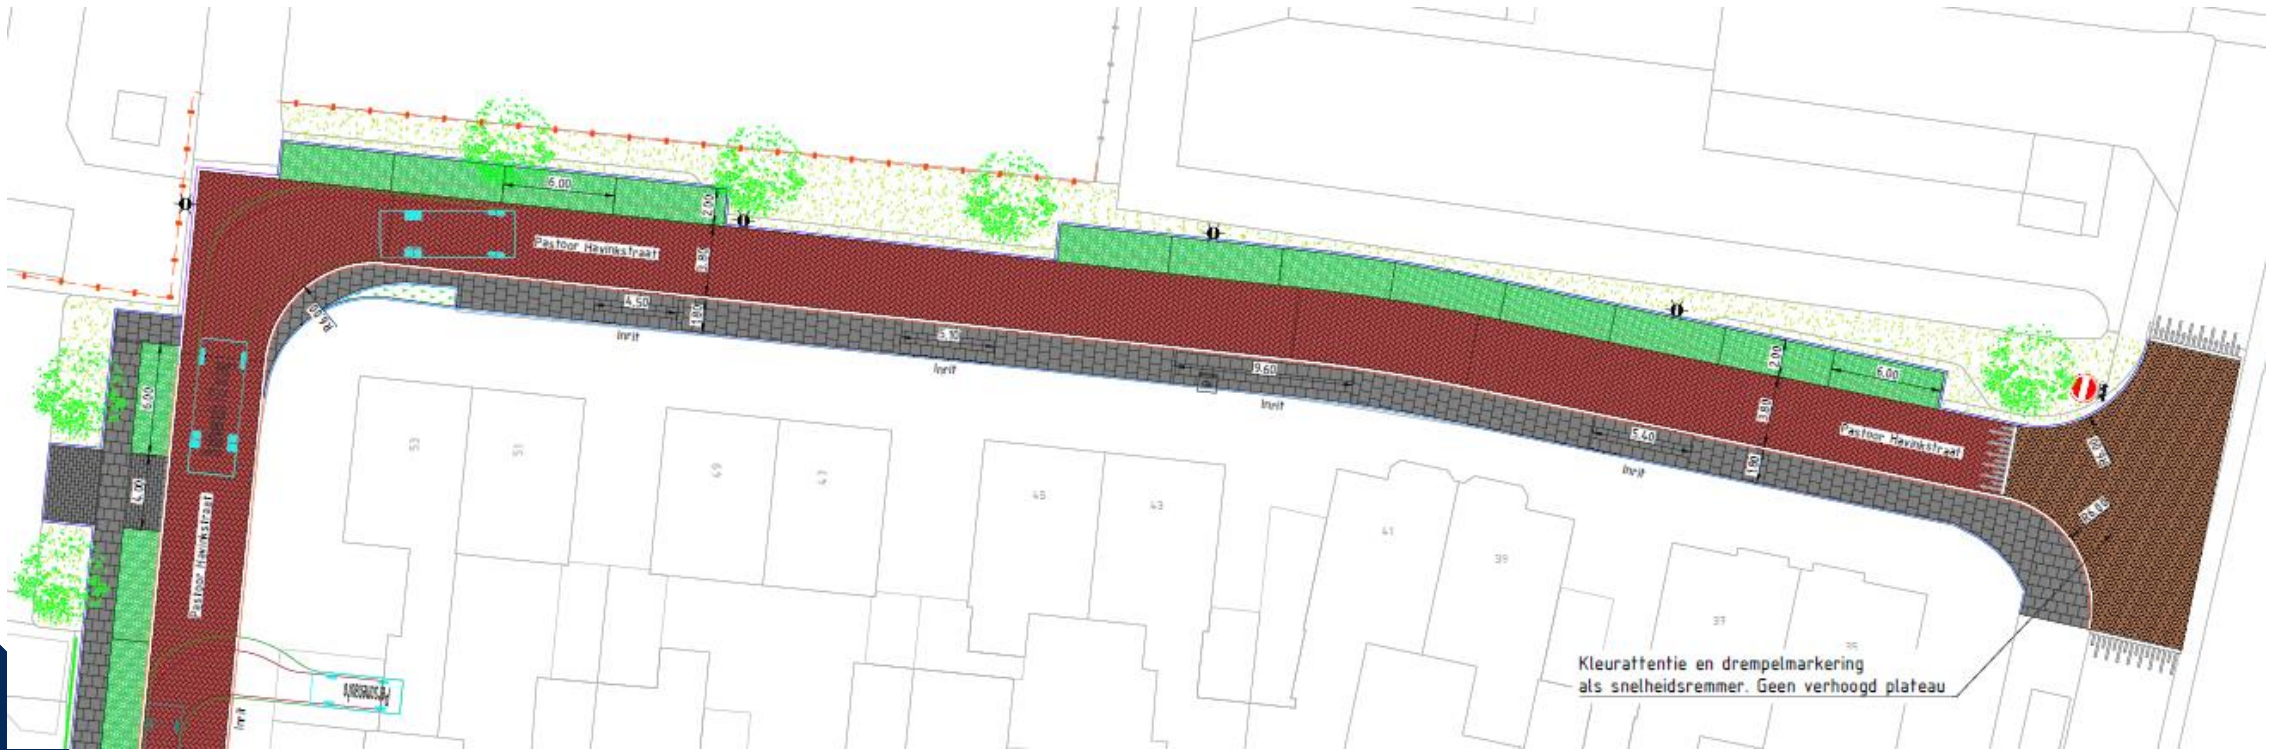

Aandachtspunten:

- 1 richting autoverkeer.
- Rijbaan 3,80 m breed met parkeren naast de rijbaan
- Snelheidsremmer door chicane niet mogelijk i.v.m. minimale beschikbare breedte van 3,50 m.
- Rabatstroken vervangen voor trottoir.
- Vergroenen door groenparkeren


Technische opgave – Hades



Aandachtspunten:

- 1 richting autoverkeer.
- Rijbaan 4,40 m breed met parkeren naast de rijbaan, breedte i.v.m. opritten.
- Parkeerverbod op straat.
- Vergroenen door groenparkeren.
- Voetpadverbinding van Gloerichstraat naar Hades.


Technische opgave – Pas. Gloerichstraat Noord

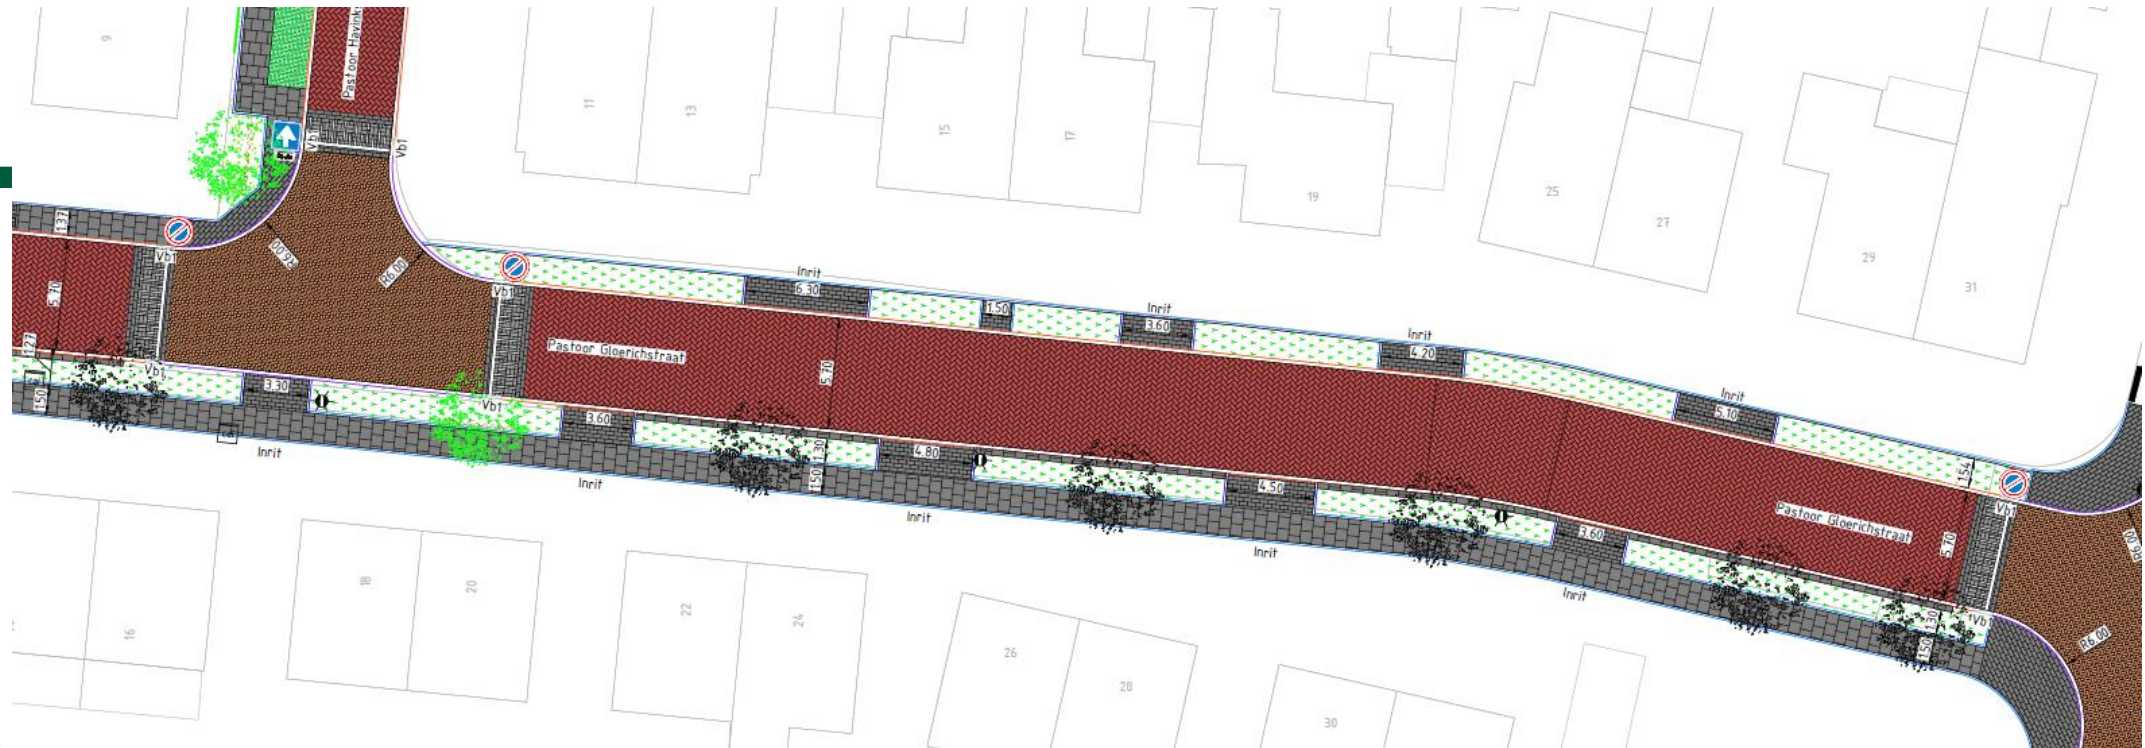

Aandachtspunten:

- 2 richtingen autoverkeer.
- Rijbaan 5,70 m breed met parkeren op de rijbaan noordzijde.
- Vergroenen door vervallen trottoir zuidzijde.
- Uitstaptegels in groenstroken voor comfort.

Technische opgave – Pas. Gloerichstraat Midden

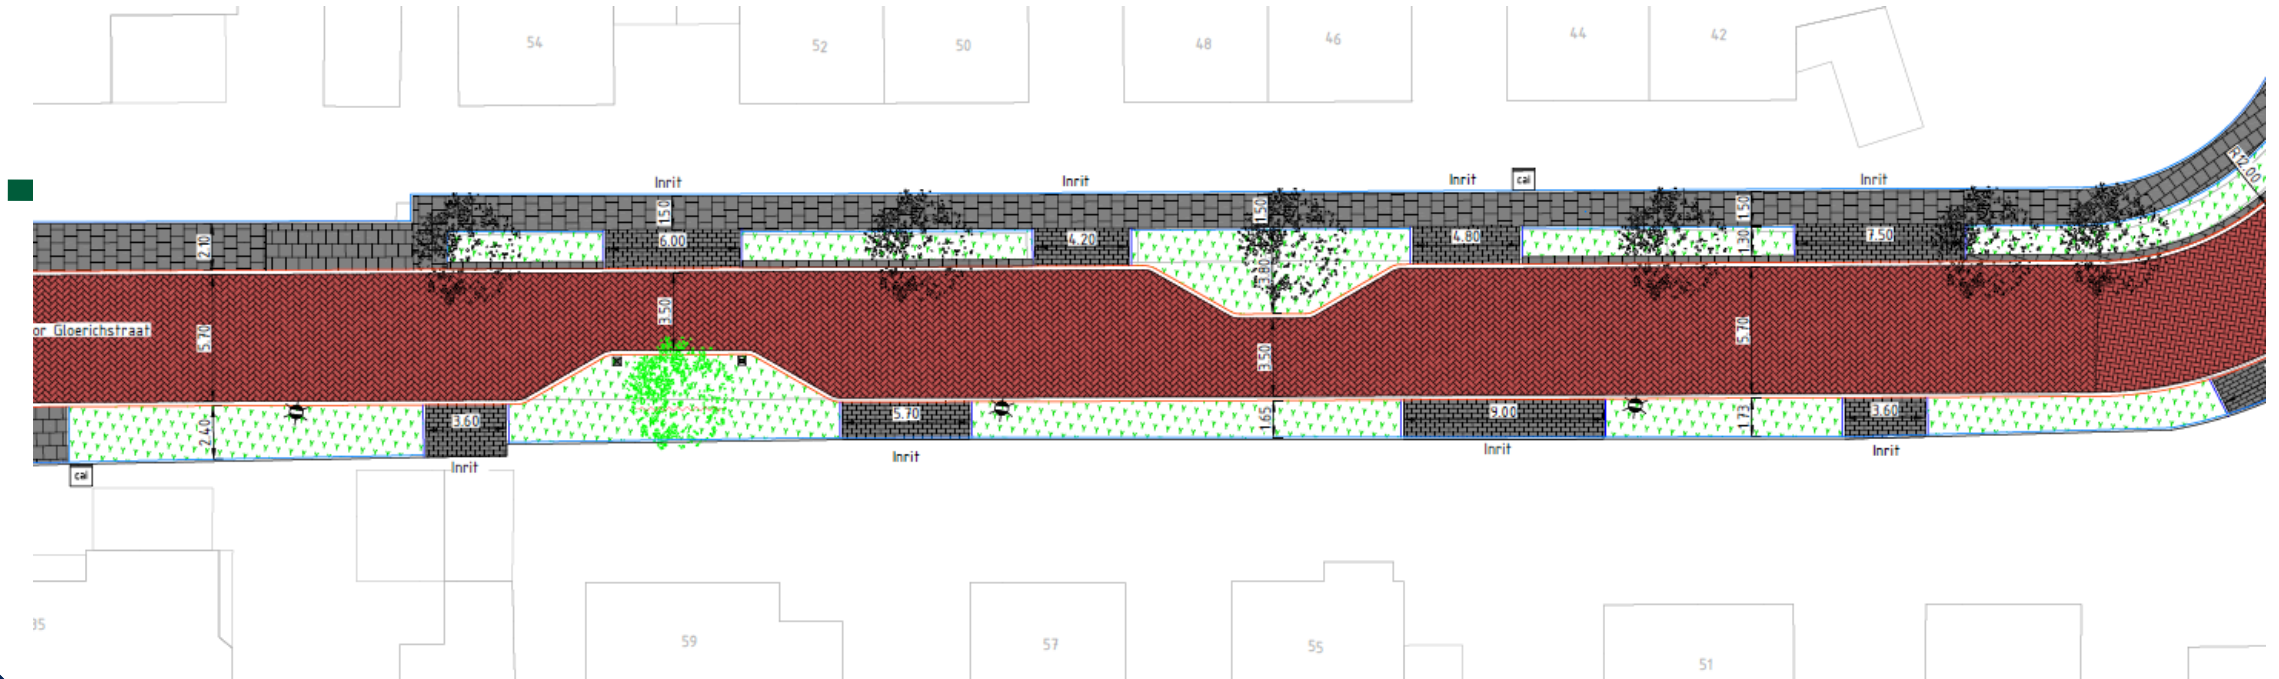

Aandachtspunten:

- 2 richtingen autoverkeer.
- Rijbaan 5,70 m breed met parkeren op de rijbaan westzijde.
- Vergroenen door vervallen trottoir oostzijde.
- Versmallingen door groenvakken, LET OP! Hierdoor minder langsparkeren mogelijk.
- Uitstaptegels in groenstroken voor comfort.
- Niet parkeren op kruisingsvlakken.

Technische opgave – Pas. Gloerichstraat West



Aandachtspunten:

- 2 richtingen autoverkeer, doodlopend.
- Rijbaan 5,70 m breed met parkeren op de rijbaan noordzijde.
- Vergroenen door vervallen trottoir zuidzijde.
- Uitstaptegels in groenstroken voor comfort.
- Parkeren geregeld in hofje door vak aanduiding.

Algemene aandachtspunten

Aantal parkeerplaatsen in relatie tot:

- Chicane
- Kruisingsvlakken

Locatie voor container opstelplaatsen

- Hoe rijdt de ophaaldienst nu?

Planning en vervolg

~~Ontwerpteam bijeenkomst 2 (jan '25)~~

- ~~• Vaststellen wensen en doelen op basis van voorlopig ontwerp en beschikbare ruimte~~
- ~~• Inloopmiddag/avond voor iedereen samen met klankbordgroep – gemeente – stegehuis~~

Ontwerpteam bijeenkomst 3 (jun '25)

- Vaststellen ontwerp en input voor detailniveau materialisatie en evt. groen

Algemene informatieavond (jul '25)

- Delen resultaat ontwerpteam aan gehele omgeving

Rondvraag

Bedankt voor jullie bijdrage!

